



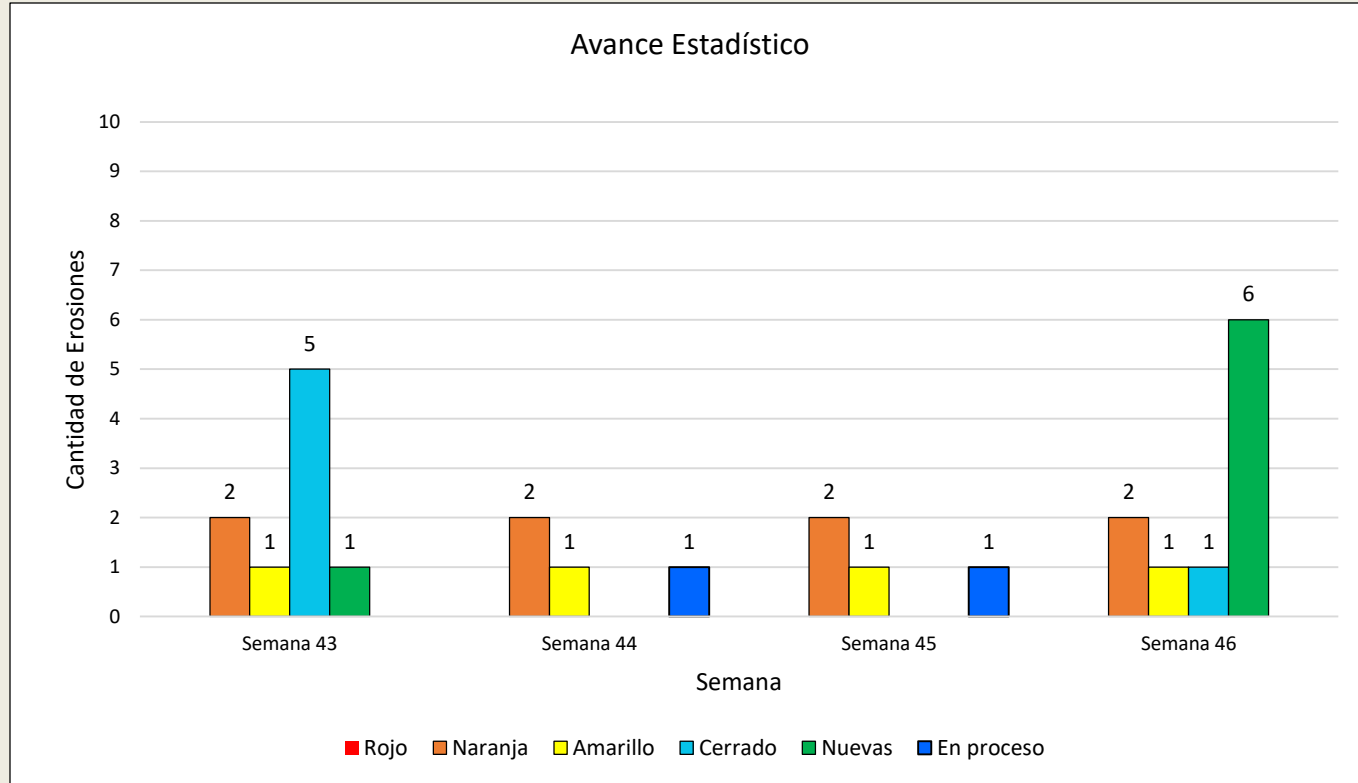
MONITOREO SEMANAL DE EROSIONES

Del 09 al 15 de Noviembre 2024

Documento Número:
Registro de Emisión:
Preparado por:

1824-363-CI-RPT-T0018
021
Mireya Guardia (MG)

Avance Estadístico (Octubre - Noviembre 2024)



R

N

EROSIONES DE PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Plan a Ejecutar

Monitoreo:

- ✓ Inspecciones diarias (y, después de Fuertes lluvias).

Mitigación/Contención:

- ✓ Desviación de las corrientes superficiales, construyendo bermas y dando forma a la zona.
- ✓ Cubrir la zona con geotextil (opcional, pero recomendado).

Reparación:

- ✓ Es recomendable, limpiar la zona antes de reanudar los trabajos.
- ✓ Reemplazar el material hasta alcanzar la superficie de diseño, con el respectivo control de calidad.

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

- Sector 1 → (4)
- Sector 3 → (1)
- Sector 4 → (1)

Cerrado

- Sector 3 → (1)

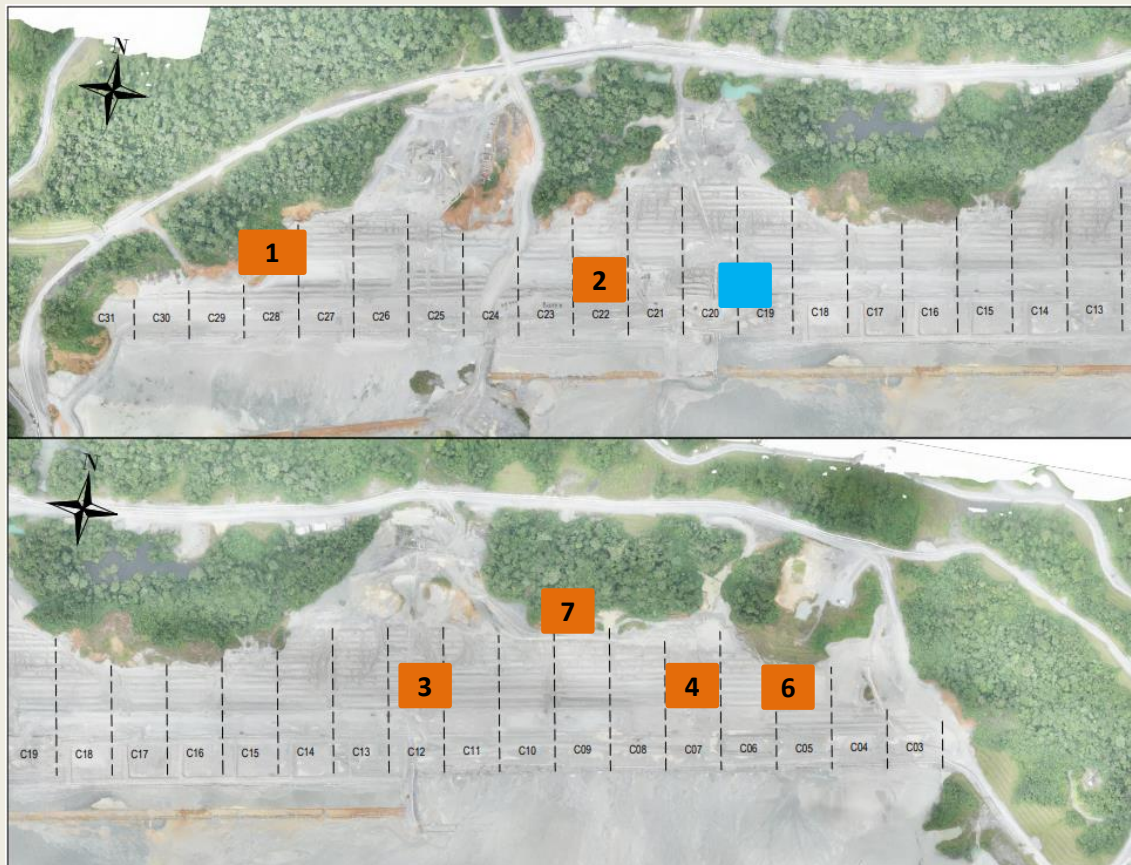
En proceso

AA-Aguas Arriba

AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Erosiones en la Presa Norte



Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

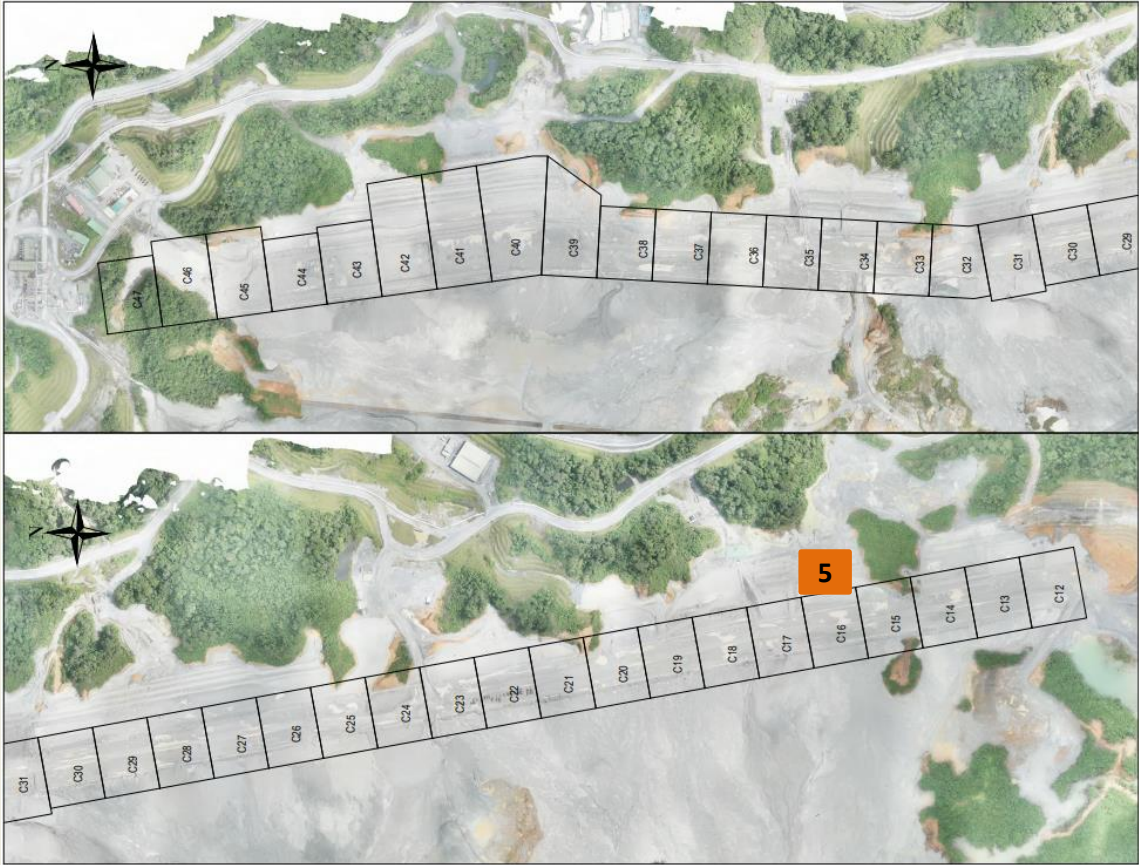
Secuencia de reparación sugerida

- Rojo
- Naranja
 - WRP#5 → (1)
- Cerrado
- En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Erosiones en la Presa Este



Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

- ND Sector 1 → (4)
- ND Sector 3 → (1)
- ND Sector 4 → (1)
- ED WRP#5 → (1)

Cerrado








- ND Sector 3 → (1)

En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Erosiones (Prioridad Media)

Sector 1 ND		Sector 1 ND		Sector 3 ND		Sector 4 ND		WRP#5 ED	
									
6	Celda 06 AB UTM 983414 537792	3	Celda 12 AB UTM 983315 537207	Celda 19-20 AB UTM 983097 536519		1	Celda 27-28-29 AB UTM 982987 535655	5	Celda 16 AB UTM 979967 539083
									
7	Canal B UTM 983374 537403			2	Celda 22 AB UTM 983125 536250				
									
4	Celda 07 AB UTM 983377 537736								

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

Cerrado

En proceso

AA-Aguas Arriba

AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Detalle de erosión:

- Se registra erosiones en banquetas de la celda 19-20 ND aguas abajo al nivel 89m. (Instrumentación geotécnica cerca del área. UTM 983089 536530).
- 1 Se ha registrado erosión en las celdas 27-28-29 ND en el área de conexión con el terreno natural, lo que ha afectado el filtro de contacto.
- 2 Se ha registrado erosion causada por la escorrentía en las banquetas de la celda 22 ND aguas abajo.
- 3 Se ha registrado erosion en las banquetas de la celda 12ND aguas abajo, causada por la escorrentía.
- 4 Se observa inicio de erosión en banqueta al nivel 68.63m de la celda 07ND aguas abajo

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

Cerrado

En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Detalle de erosión:

- 5 Se ha registrado erosion causada por la escorrentía en las banquetas de la celda 16 ED aguas abajo
- 6 Se ha registrado erosión en el área de conexión con el terreno natural, lo que ha afectado el filtro de contacto.
- 7 El área del canal B presenta erosión debido a las escorrentias de las lluvias.

A

EROSIONES DE PRIORIDAD BAJA

Plan a Ejecutar

Monitoreo:

- ✓ Inspecciones diarias (y, después de Fuertes lluvias).

Mitigación/Contención:

- ✓ Desviación de las corrientes superficiales, construyendo bermas y dando forma a la zona.

Reparación:

- ✓ Es recomendable, limpiar la zona antes de reanudar los trabajos.
- ✓ Reemplazar el material hasta alcanzar la superficie de diseño, con el respectivo control de calidad.

Notas:

Secuencia de
Reparación sugerida

■ Amarilla

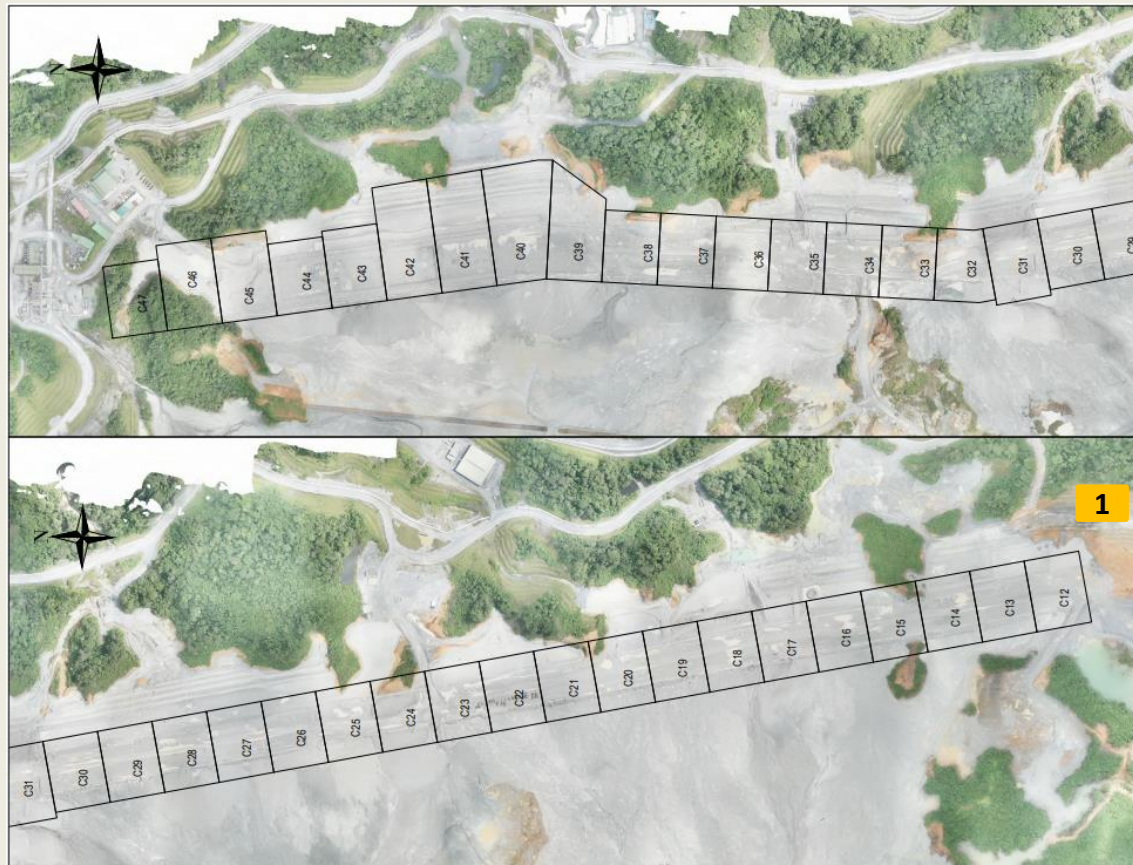
▪ WRP#6 → (1)

■ Cerrado

■ En proceso

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Erosiones en la Presa Este



Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Amarillo

ED WRP#6 → (1)

Cerrado

En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Erosiones (Prioridad Baja)

WRP#6 ED					
					
1	Canal 6 UTM 979470 539197				

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

 Amarillo

 Cerrado

 En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 09 al 15 de Noviembre de 2024

Detalle de erosión:

- 1 Se registra erosión en la pared este del Canal 06, material saprolítico. Será necesario limpiar y reemplazar con rocas

Gracias!
